


ERRATUM

ANNEXE 3 DE LA PIECE : « 9-PGOD_VF_octobre 2018 » DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE :

Pour une meilleure lisibilité des cotes de dragages, et des erreurs de cartographie des fiches 2 (Lorient-La Base) et 14 (Passe Ouest) du document mis à l'enquête publique, les fiches 1 à 14 du document mis à l'enquête publique sont remplacées par les fiches 1 à 14 ci-après.

KERNEVEL

Le port de Kernevel n'a jamais fait l'objet d'une opération de dragage depuis sa création en 1988.

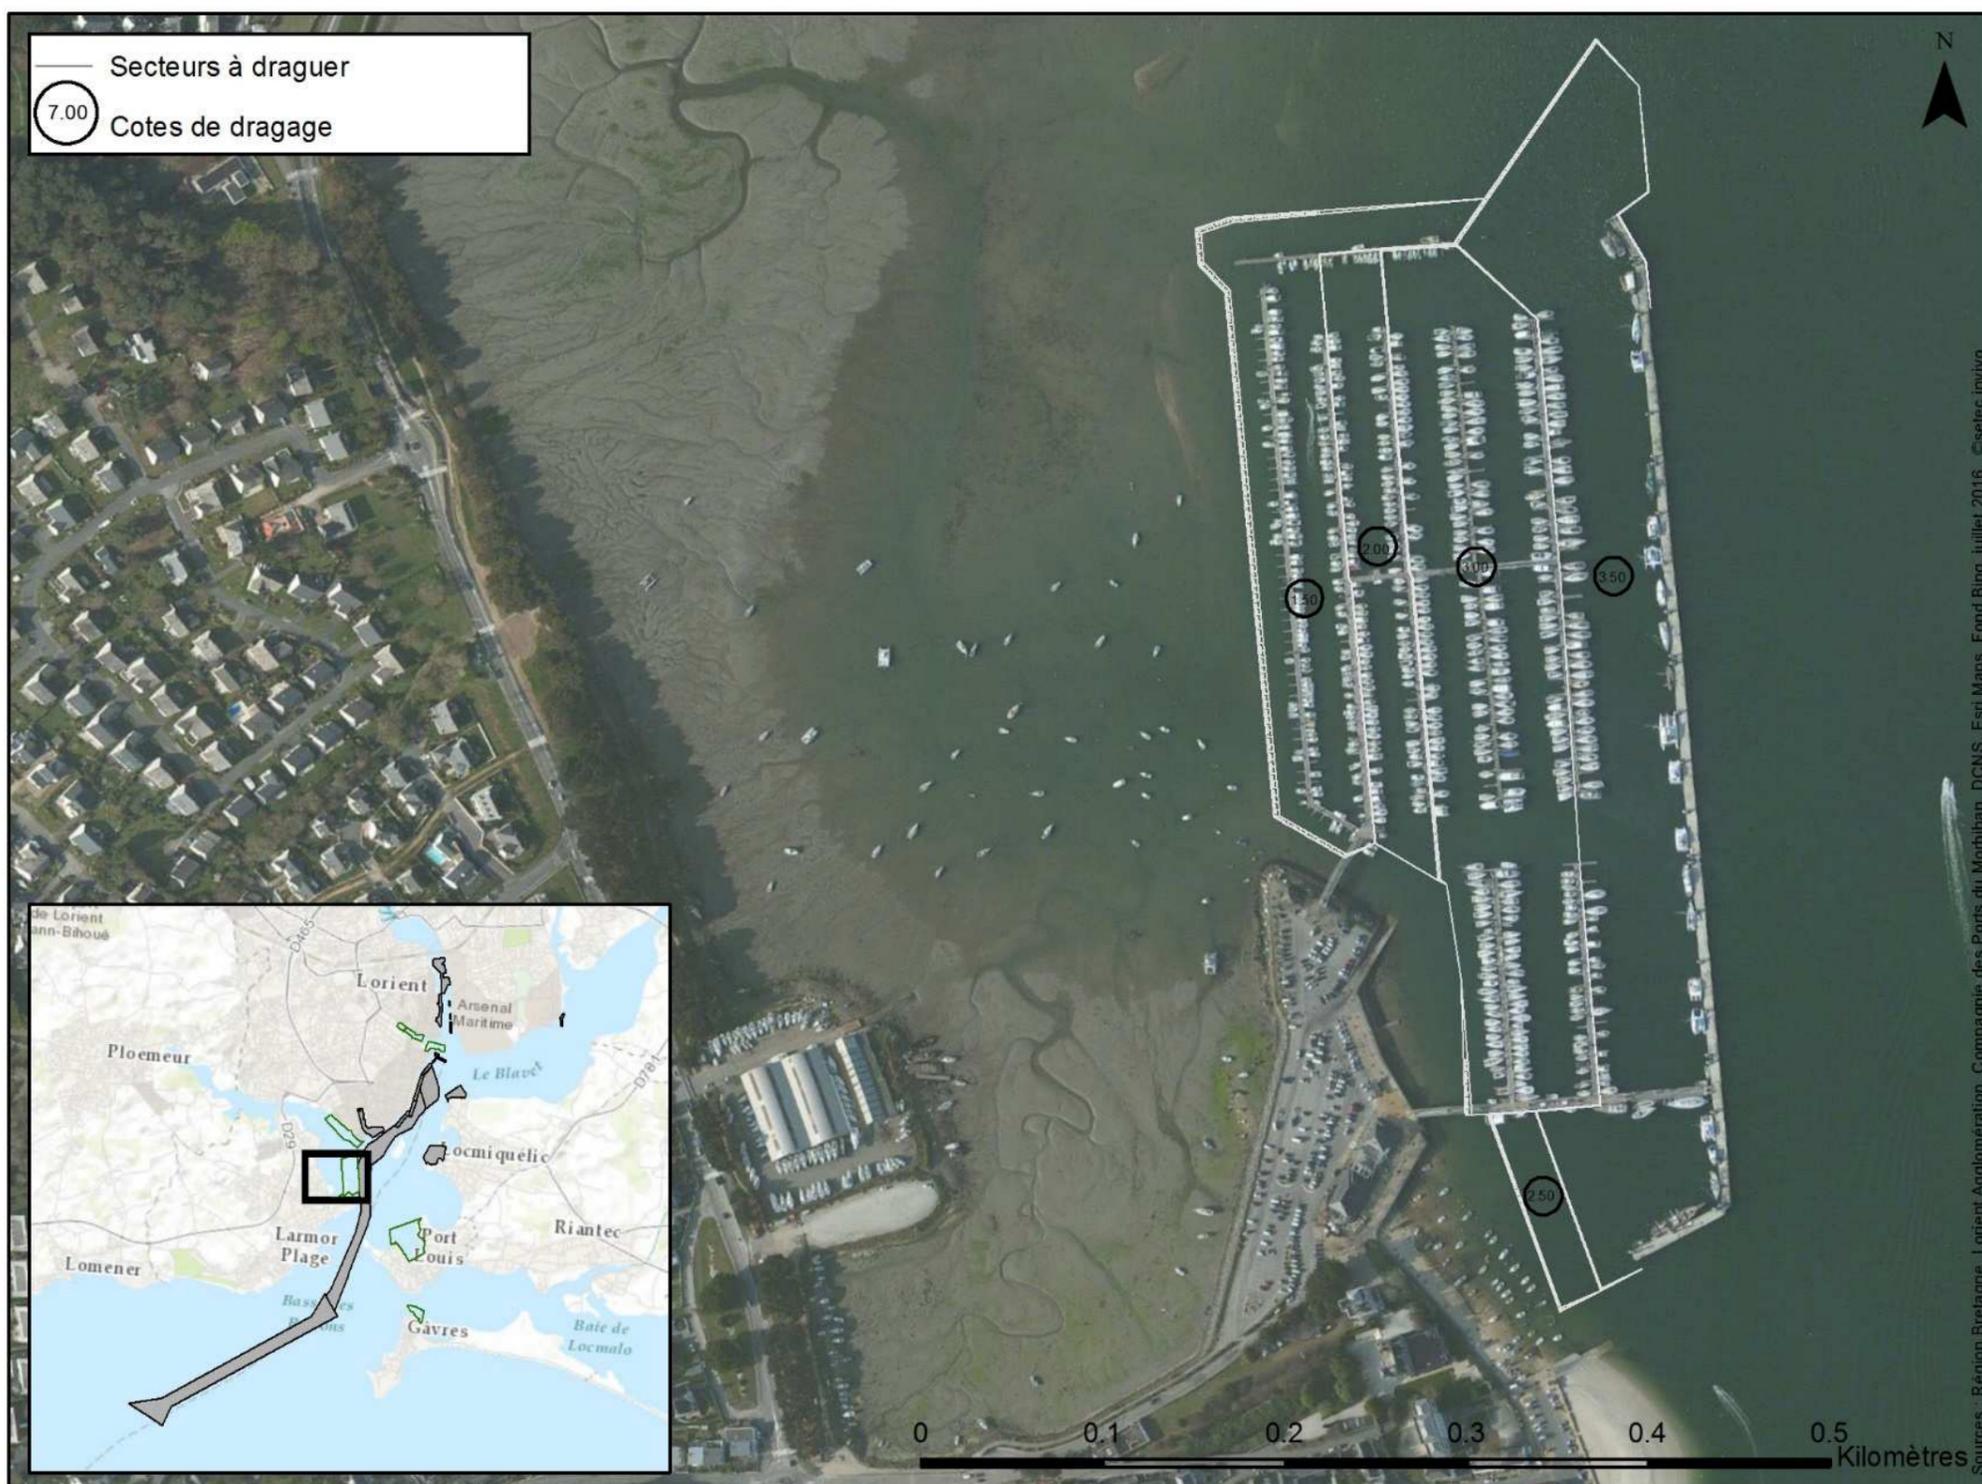

LORIENT LA BASE

Le dernier et unique dragage du port de Lorient La Base date de 2014.

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
2014	Entretien	48 000	Site d'immersion de Groix	DAM (Fort Boyard)

Historique des opérations de dragage




KEROMAN

Le dernier dragage du port de Keroman date de 1998.

En 2015, une opération de nettoyage des fonds a été réalisée pour enlever les macro-déchets, en vue d'une opération de dragage ultérieure.

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
1998	Entretien	1 000	Site d'immersion de Groix	NR

Historique des opérations de dragage

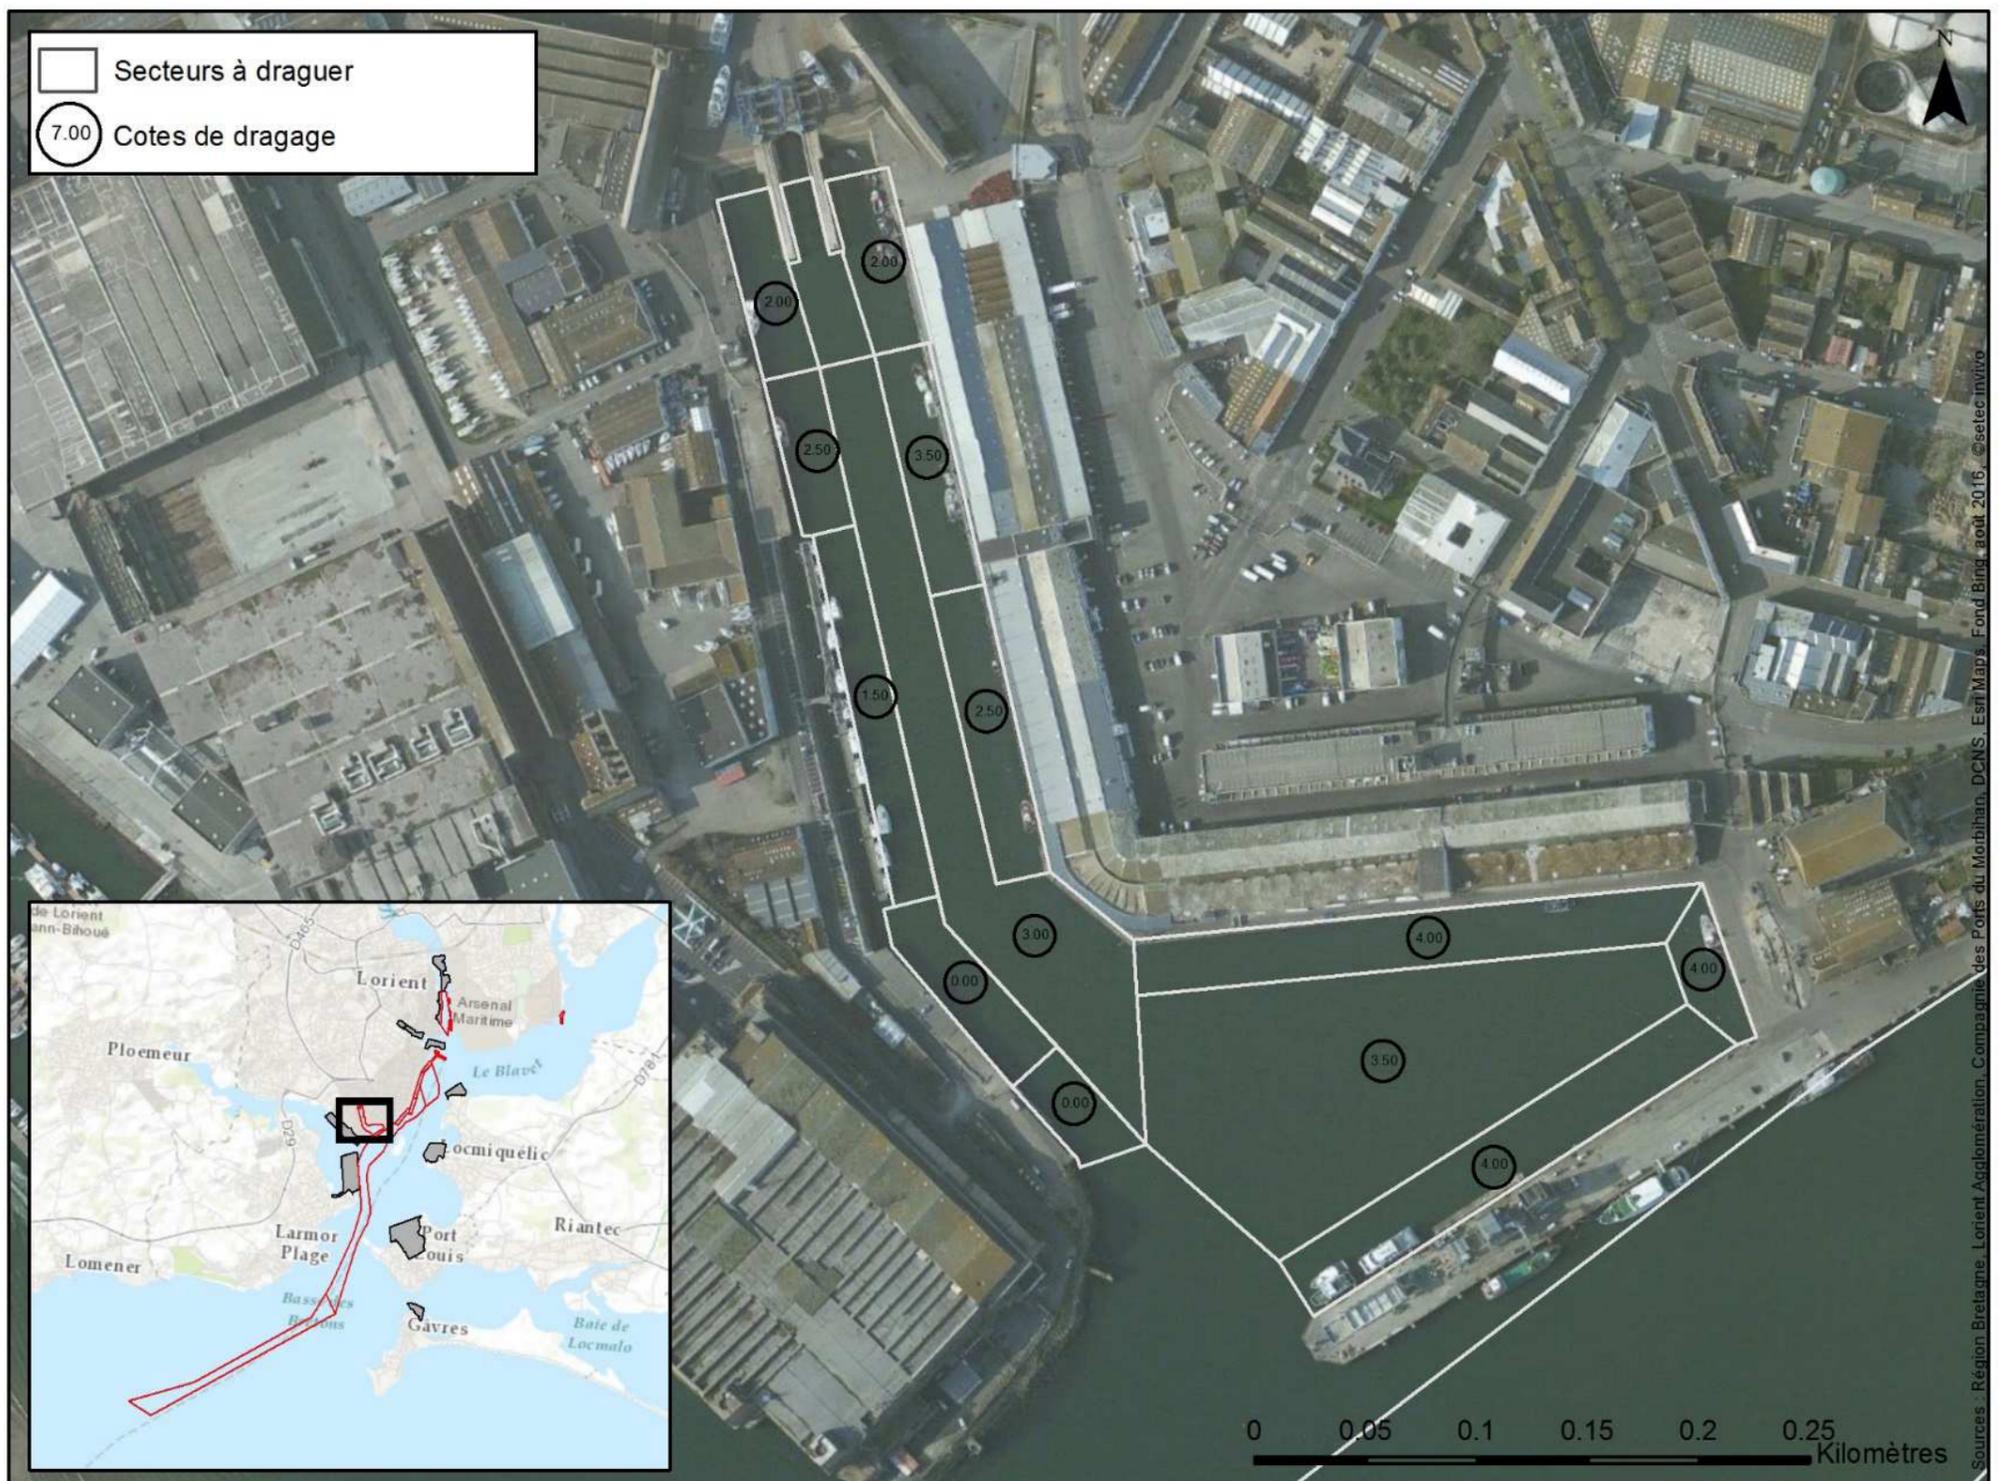

KERGROISE (SOUILLES, EVITAGE, GARE MARITIME, RO-RO)

Le dernier dragage réalisé sur le secteur de Kergroise date de 2015.

L'historique des dragages présenté ci-après regroupe également le site Scorff-rive gauche.



KERGROISE (SOUILLES, EVITAGE, GARE MARITIME, RO-RO)

Sous-zone	Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2001	NR	35 500	Site d'immersion de Groix	NR
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2002	NR	4 300	Site d'immersion de Groix	NR
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2005	NR	8 800	Site d'immersion de Groix	NR
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2007-2008	Travaux neufs (approfondissement)	56 950	Site d'immersion de Groix	NR
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2010	Travaux neufs (approfondissement)	51 200	Site d'immersion de Groix	NR
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2011	Travaux neufs (approfondissement)	43 700	Site d'immersion de Groix	NR
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2012	NR	3 600	Site d'immersion de Groix	NR
Souilles des quais (656 m et 150 m)	2015	NR	31 165	Site d'immersion de Groix	NR
Gare maritime	2013	NR	6 600	Site d'immersion de Groix	NR
Poste roulier	1997	NR	9 000	Site d'immersion de Groix	NR
Poste roulier	2002	NR	500	Site d'immersion de Groix	NR
Poste roulier	2013	NR	6 700	Site d'immersion de Groix	NR
Poste roulier	2015	Entretien	6 450	Site d'immersion de Groix	NR
Zone d'évitage	2001	NR	34 600	Site d'immersion de Groix	NR
Zone d'évitage	2002	NR	8 700	Site d'immersion de Groix	NR
Zone d'évitage	2008	Travaux neufs (approfondissement)	56 900	Site d'immersion de Groix	NR
Zone d'évitage	2011	Travaux neufs (approfondissement)	83 400	Site d'immersion de Groix	NR
autres	1998	NR	9 000	Site d'immersion de Groix	NR
autres	2008	NR	99 450	Site d'immersion de Groix	NR
autres	2009	NR	4 000	Site d'immersion de Groix	NR
autres	2013	NR	13 300	Site d'immersion de Groix	NR
autres	2015	NR	8 862	Site d'immersion de Groix	NR

Historique des dragages

LORIENT CENTRE

Le dernier dragage réalisé dans le port de Lorient date de 2001 lors du dragage de la darse élévateur. Le reste du port n'a jamais été dragué.

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
2001	Entretien	2 400	NR	NR

Historique des opérations de dragage




LE ROHU

Le dernier dragage réalisé sur le port du Rohu date de 2015.

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
1997	Entretien	4 700	Site d'immersion de Groix	NR
2001	Entretien	800	Site d'immersion de Groix	NR
2004	Entretien	4 500	Site d'immersion de Groix	NR
2009-2010	Travaux neufs (création d'une souille pour des pontons, maintenant abandonnée)	39 700	Site d'immersion de Groix	DAM (Fort Boyard)
2011	Entretien	13 600	Site d'immersion de Groix	DAM (Fort Boyard)
2013	Entretien	17 400	Site d'immersion de Groix	DAM (Fort Boyard)
2015	Entretien	11 834	Site d'immersion de Groix	Ponton grue à benne preneuse + chaland

Historique des opérations de dragage

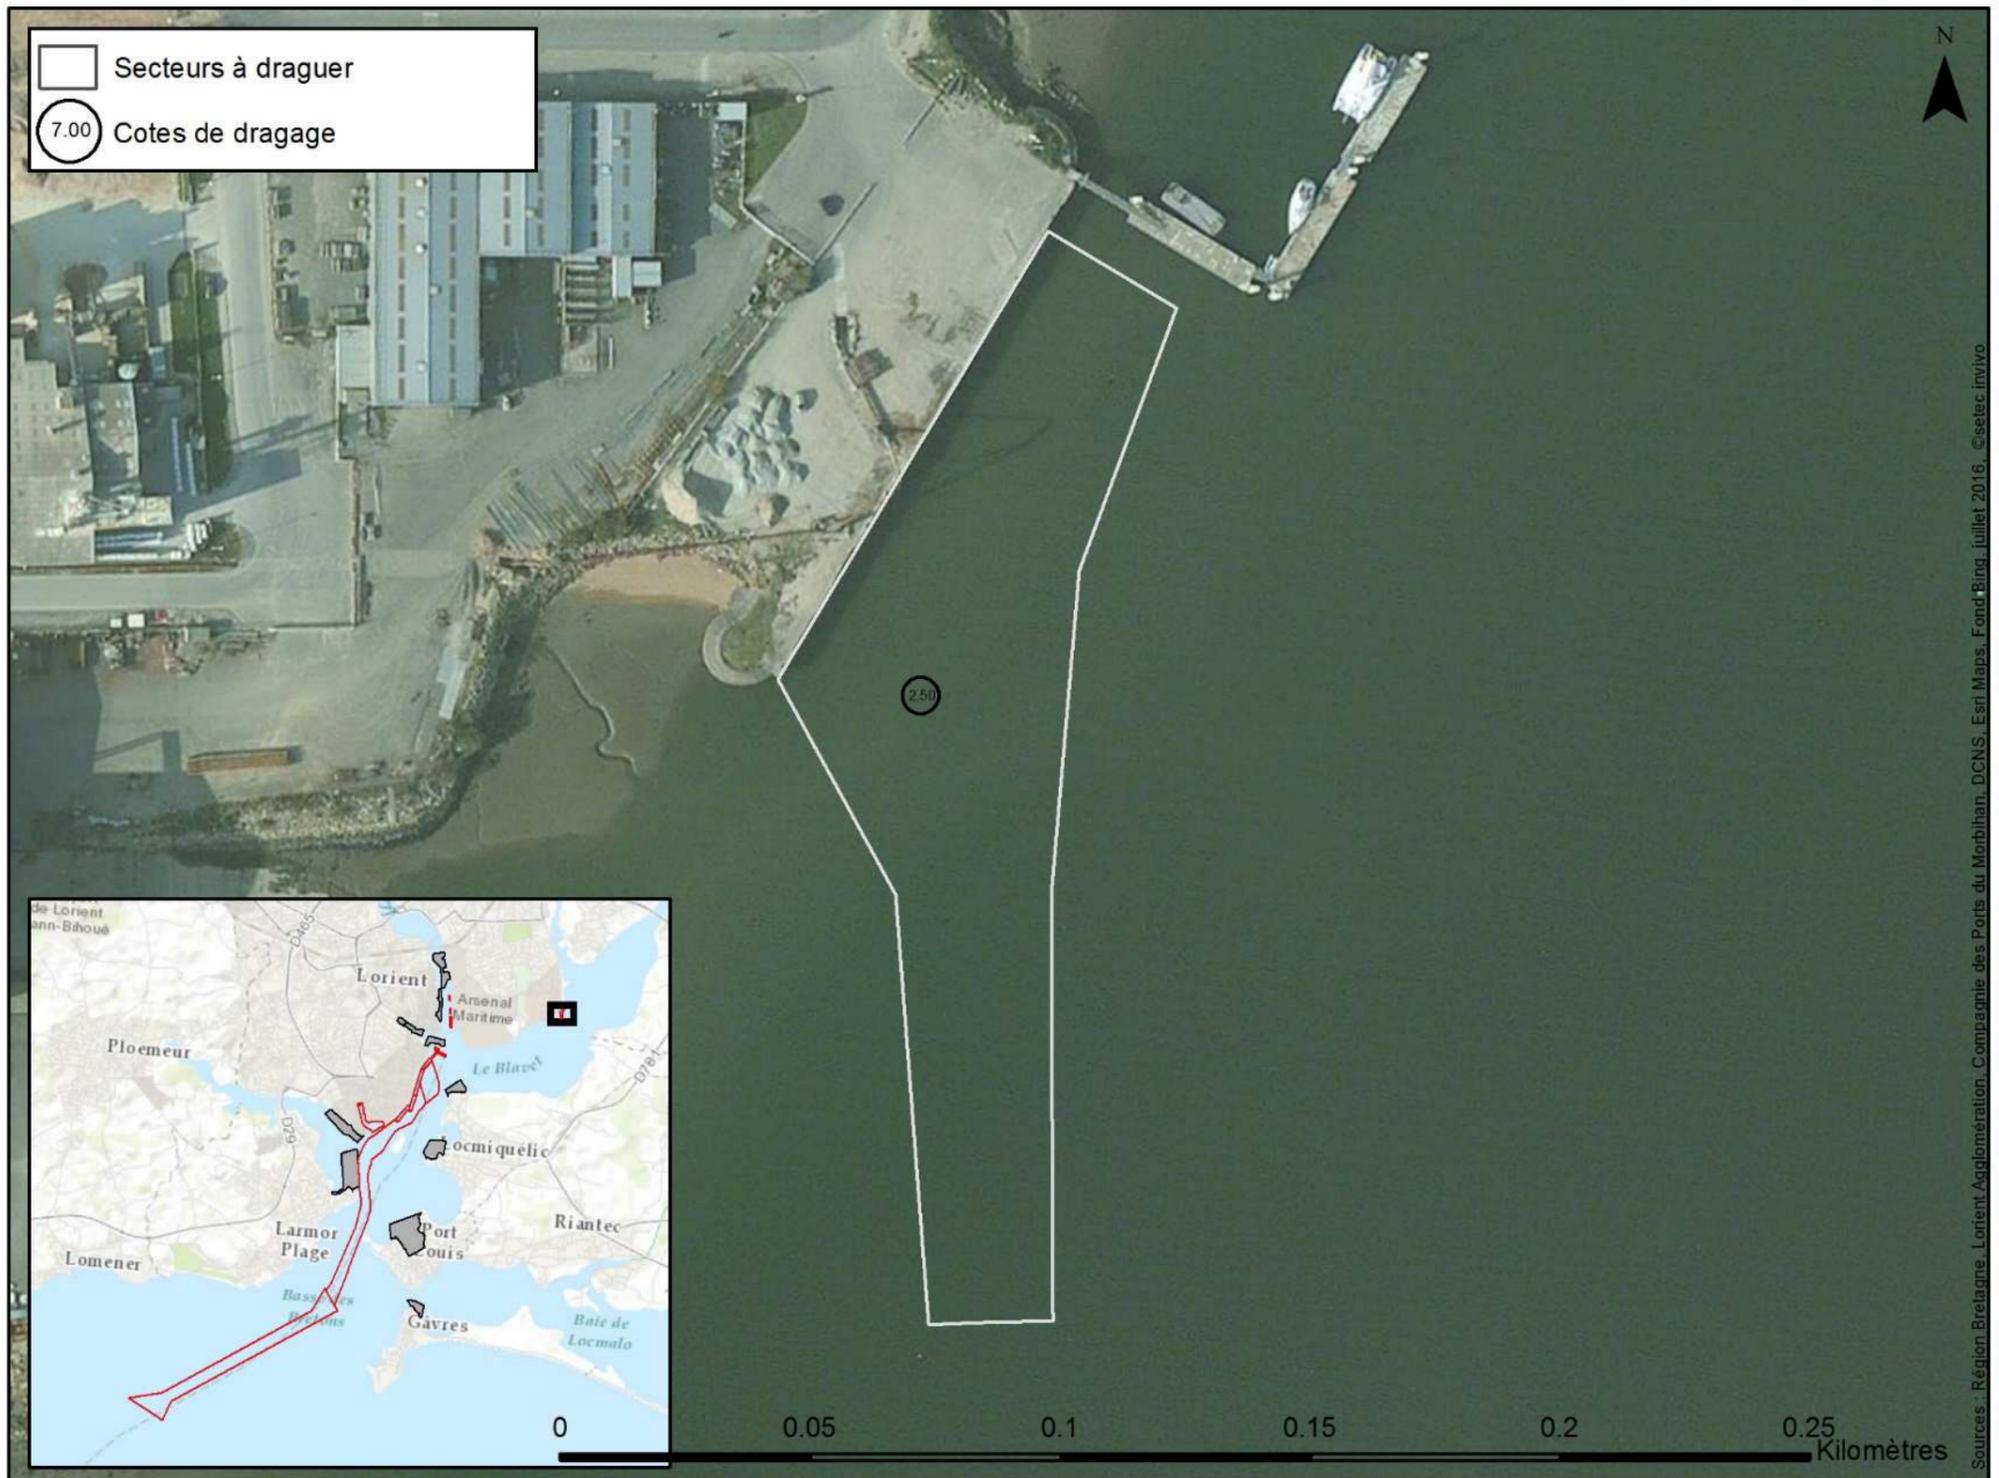


SCORFF – RIVE GAUCHE

On ne dispose pas d'informations précises sur les dragages réalisés sur ce site.



SCORFF – DCNS

Le plan d'eau des chantiers de DCNS Lorient est dragué tous les ans. La dernière opération date de 2015,

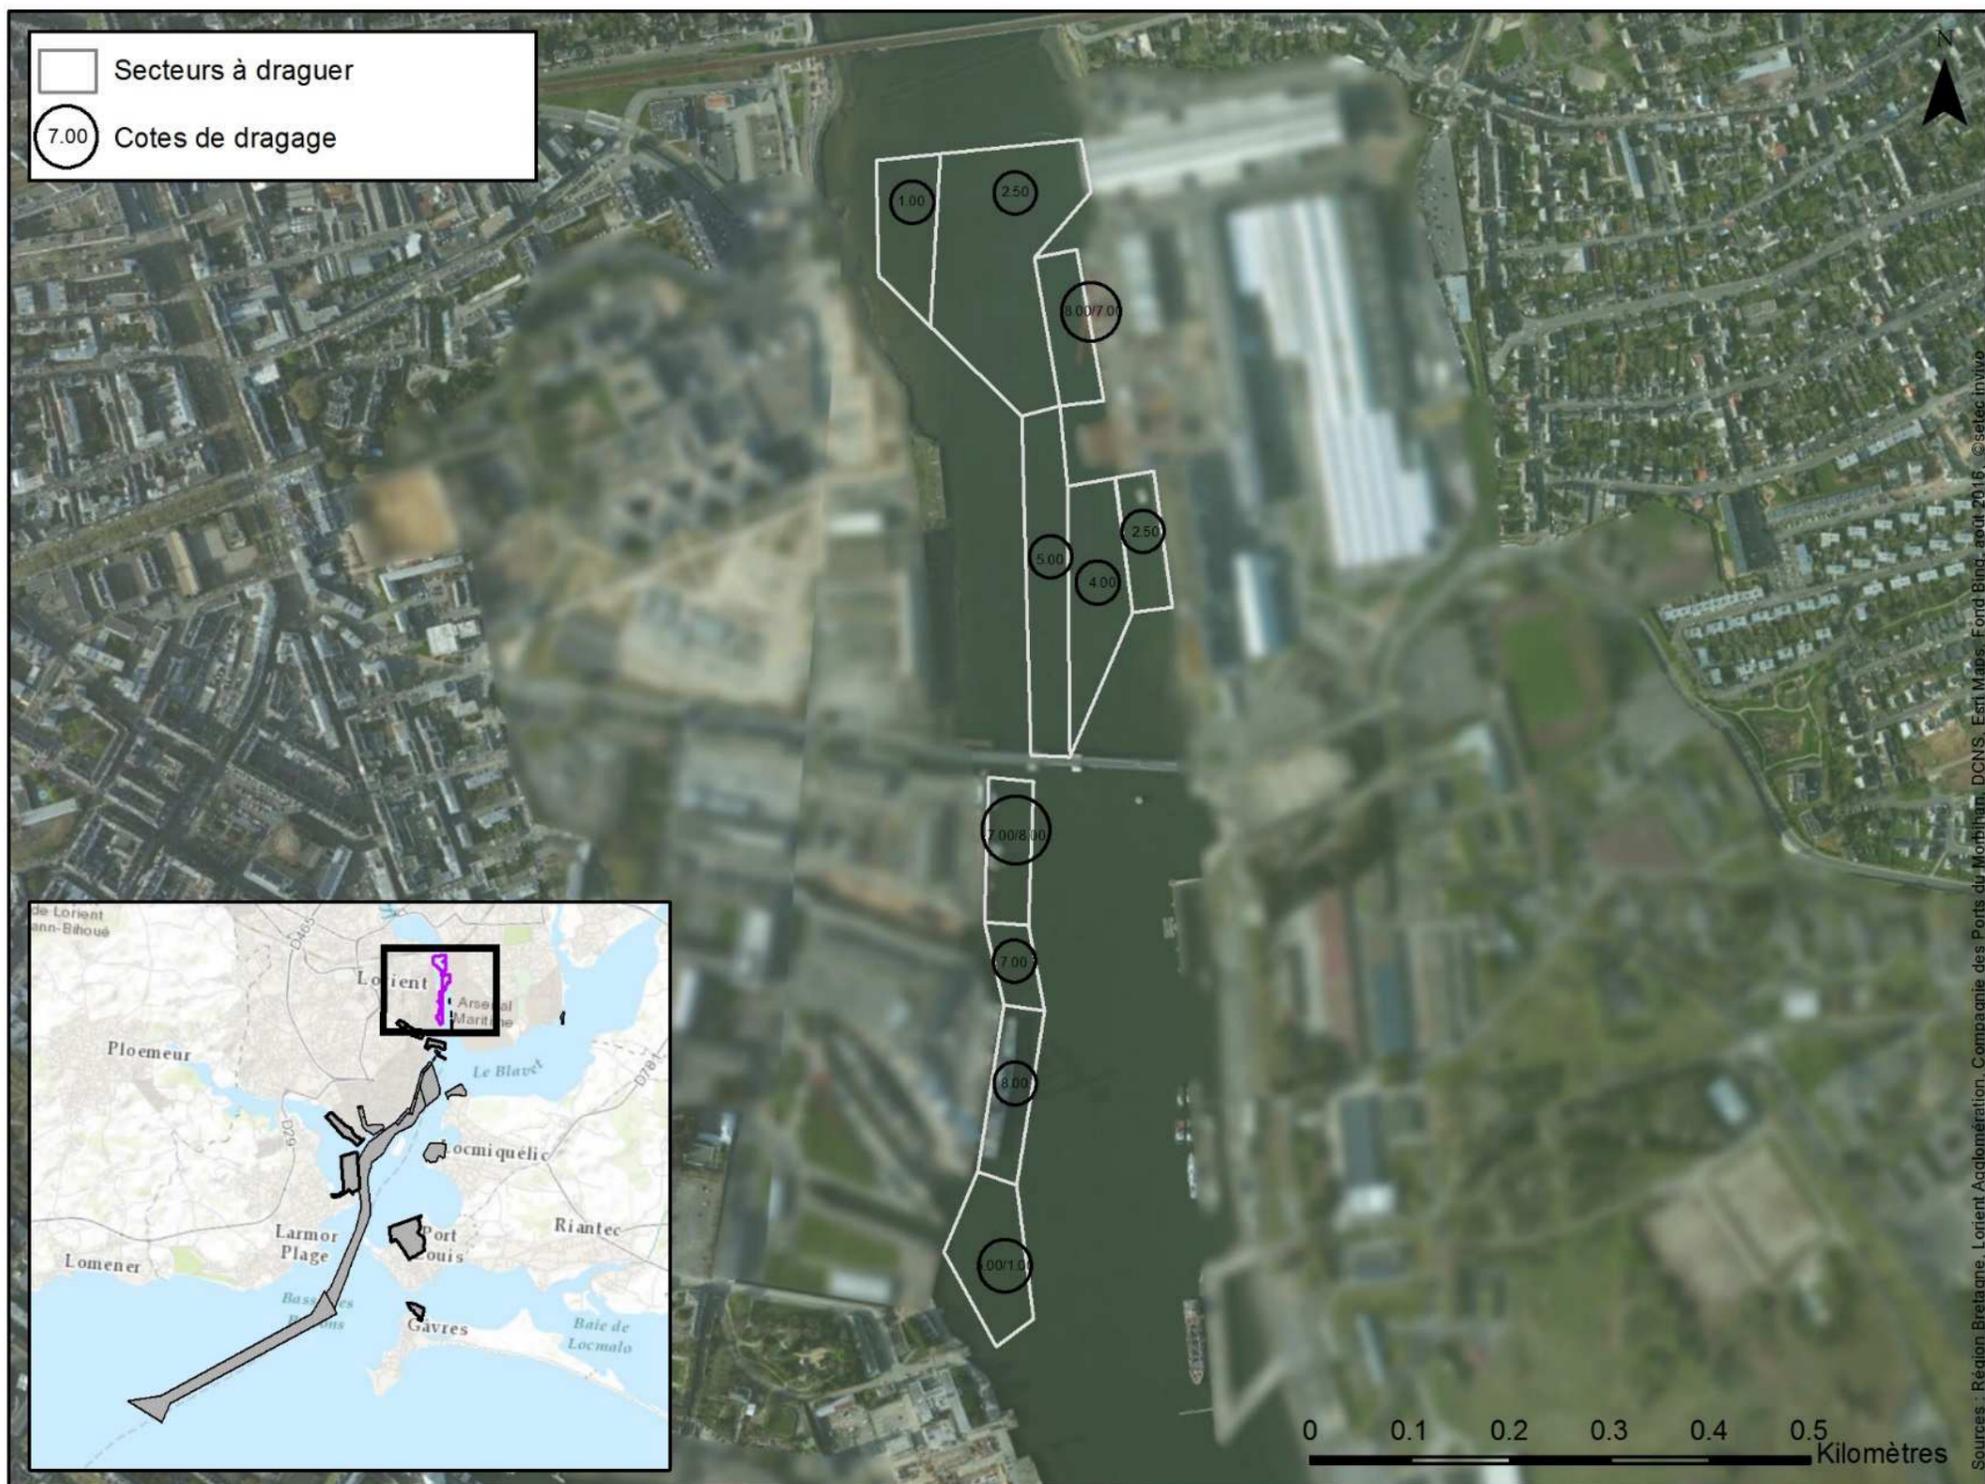

SCORFF – DCNS

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
1997	NR	27 000	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
1998	NR	23 000	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
1999	NR	22 700	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2001	NR	34 000	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2002	NR	14 700	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2003	NR	16 800	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2004	NR	18 700	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2005	Entretien	12 500	Mise en Installation déchets inertes (Hennebont - Lieu dit Polvern) après déshydratation à la chaux	pelle sur ponton
2005	Entretien	34 000	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2006	Entretien	8 700	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2007	Entretien	13 210	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2008	Entretien	6 200	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2010	Entretien	800	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2010	Entretien	26 300	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2011	Entretien	26 300	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2012	Entretien	4 400	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2013	Entretien	9 850	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2014	Entretien	16 802	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland
2015	Entretien	12 070	Site d'immersion de Groix	pelle sur ponton + chaland


Historique des opérations de dragage

PEN-MANE

Le dernier dragage du port de Pen Mané date de 1997 lors des travaux d'extension du port (mise en place d'un ponton brise-clapot et création de places pour la plaisance).

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
1997	Travaux d'extension du port	34 600	Site d'immersion de Groix	Ponton dipper + chaland

Historique des opérations de dragage

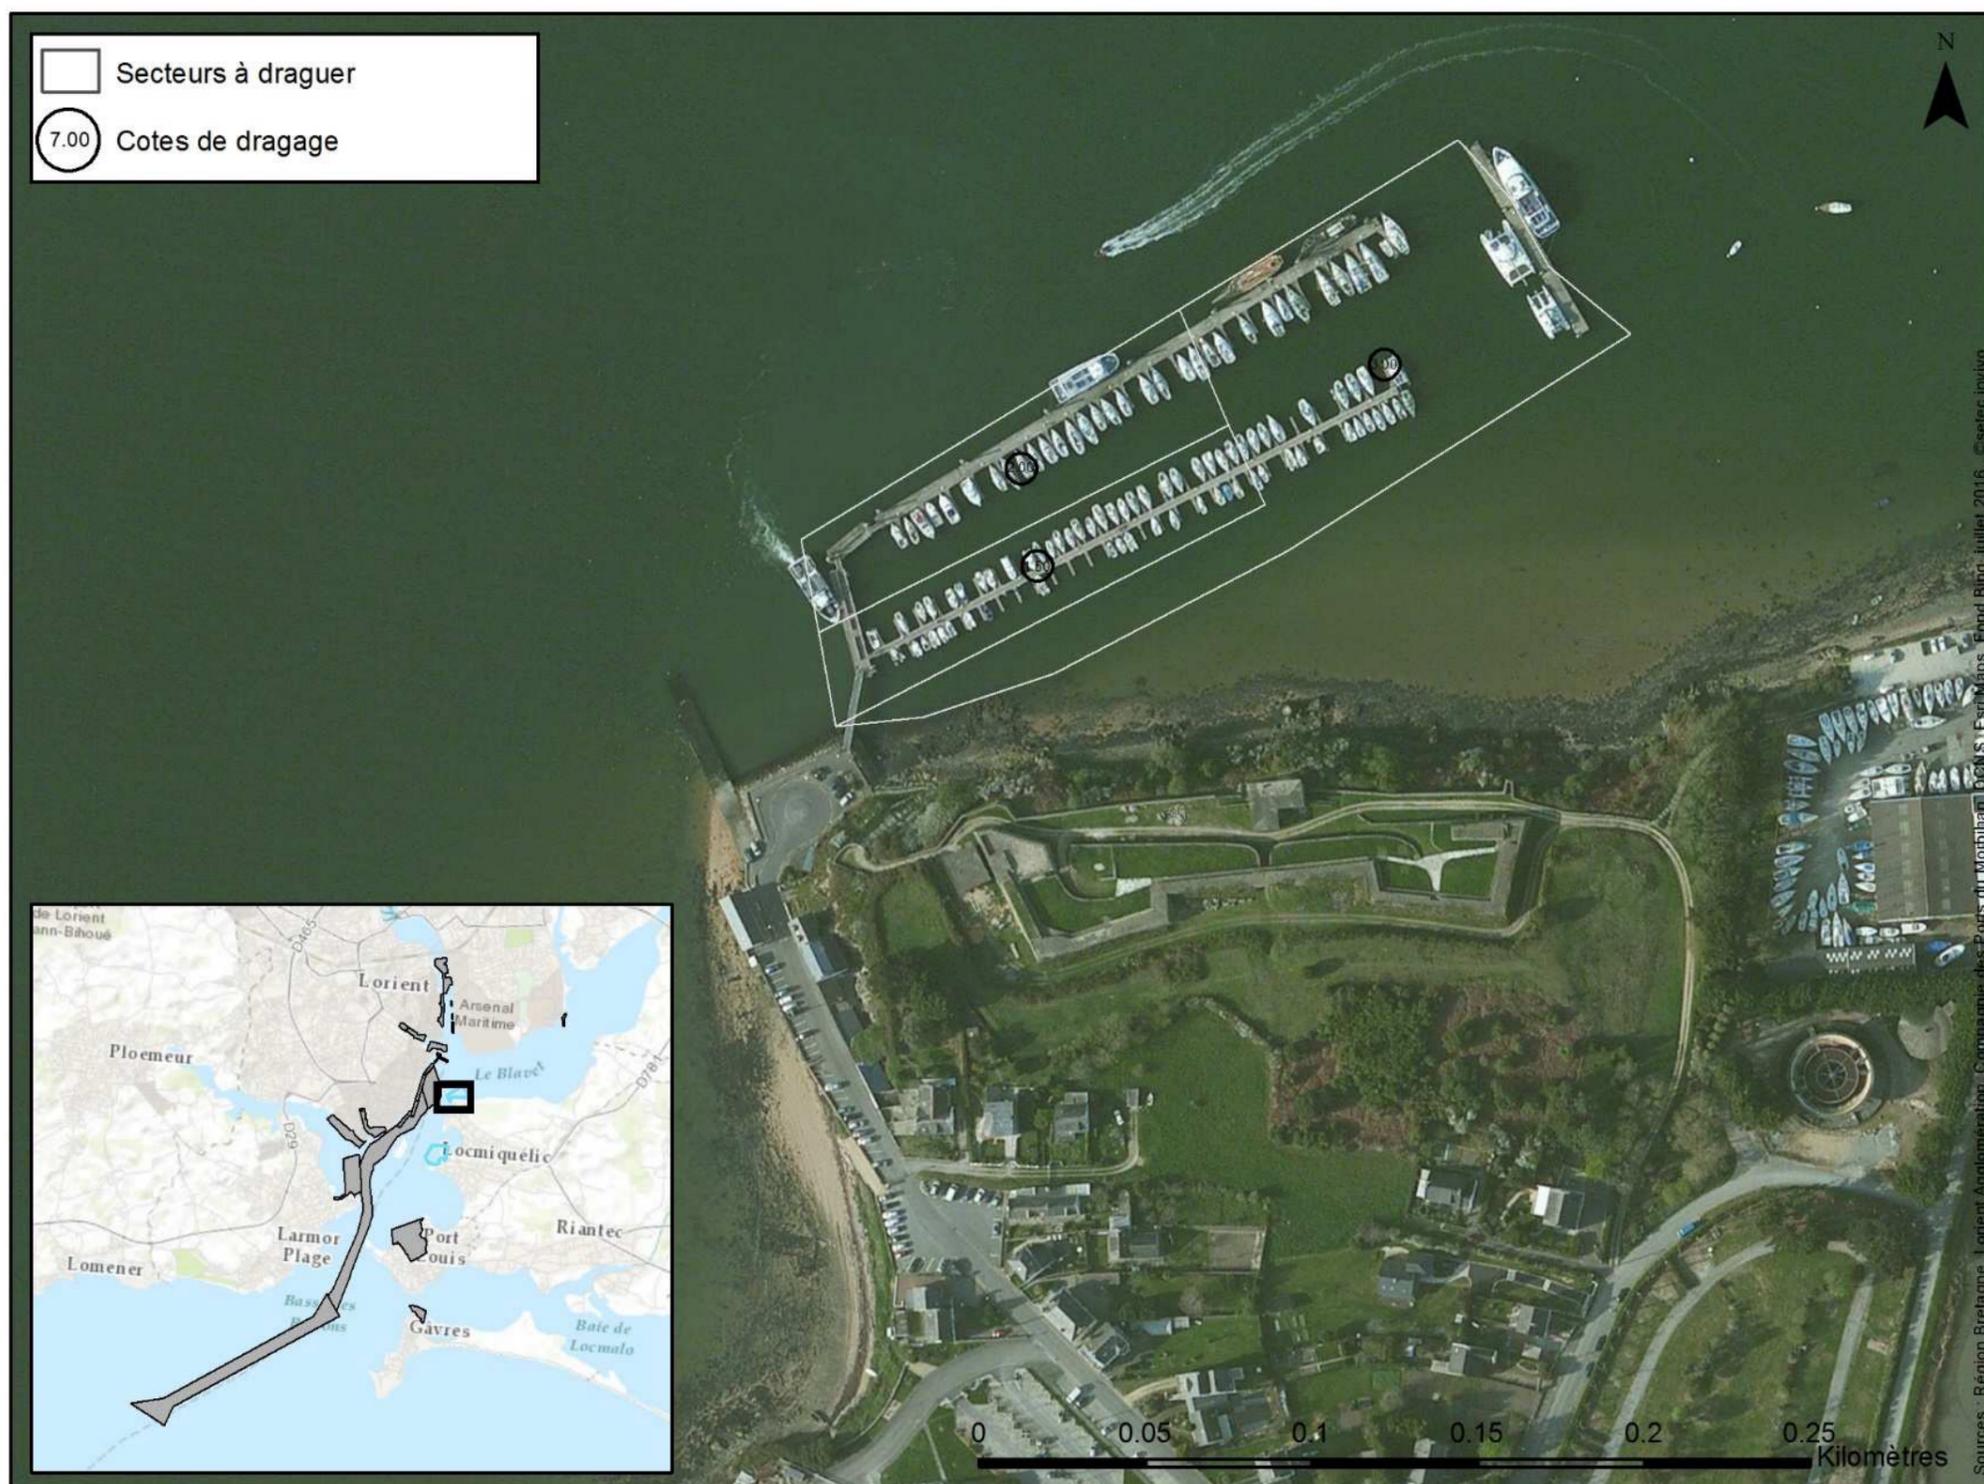


SAINTE-CATHERINE

Le dernier dragage du port de Sainte-Catherine date de l'hiver 2003/2004 lors des travaux d'extension du port.

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
2003	Travaux d'extension du port 2003/2004	90 230	Site d'immersion de Groix	Ponton dipper + chaland
2004		65 820	Site d'immersion de Groix	

Historique des opérations de dragage

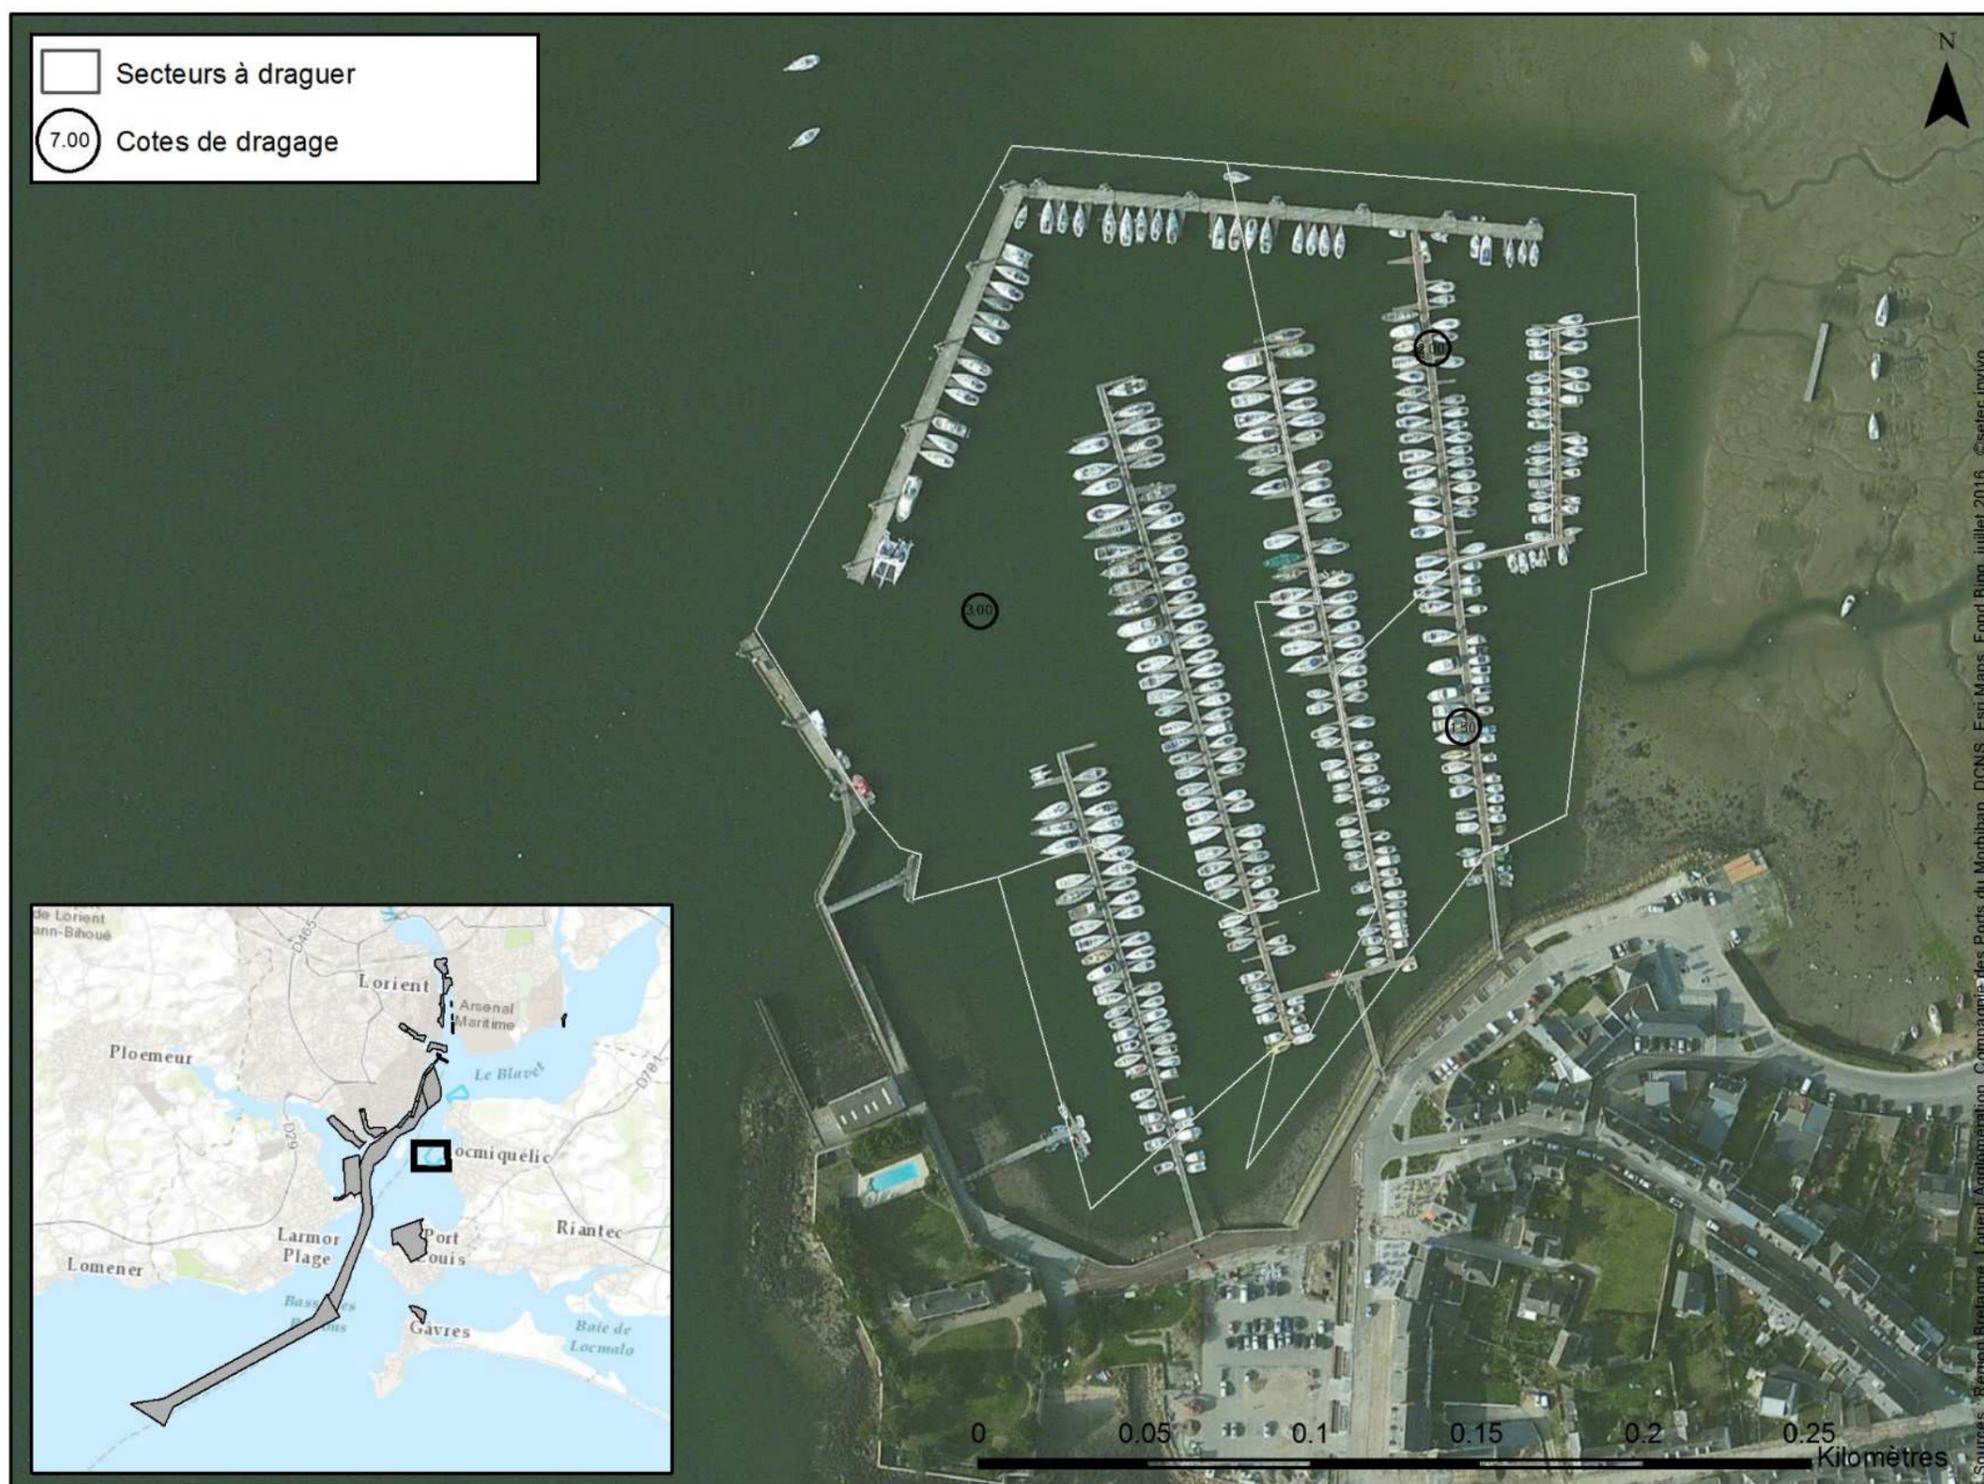


PORT-LOUIS

Le dernier dragage du port de Port-Louis date de 2009 lors des travaux d'aménagement du port.

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
2000	Entretien	1 000	Site d'immersion de Groix	NR
2009	Travaux d'aménagement du port	194 000	Site d'immersion de Groix	Ponton dipper + chaland

Historique des opérations de dragage

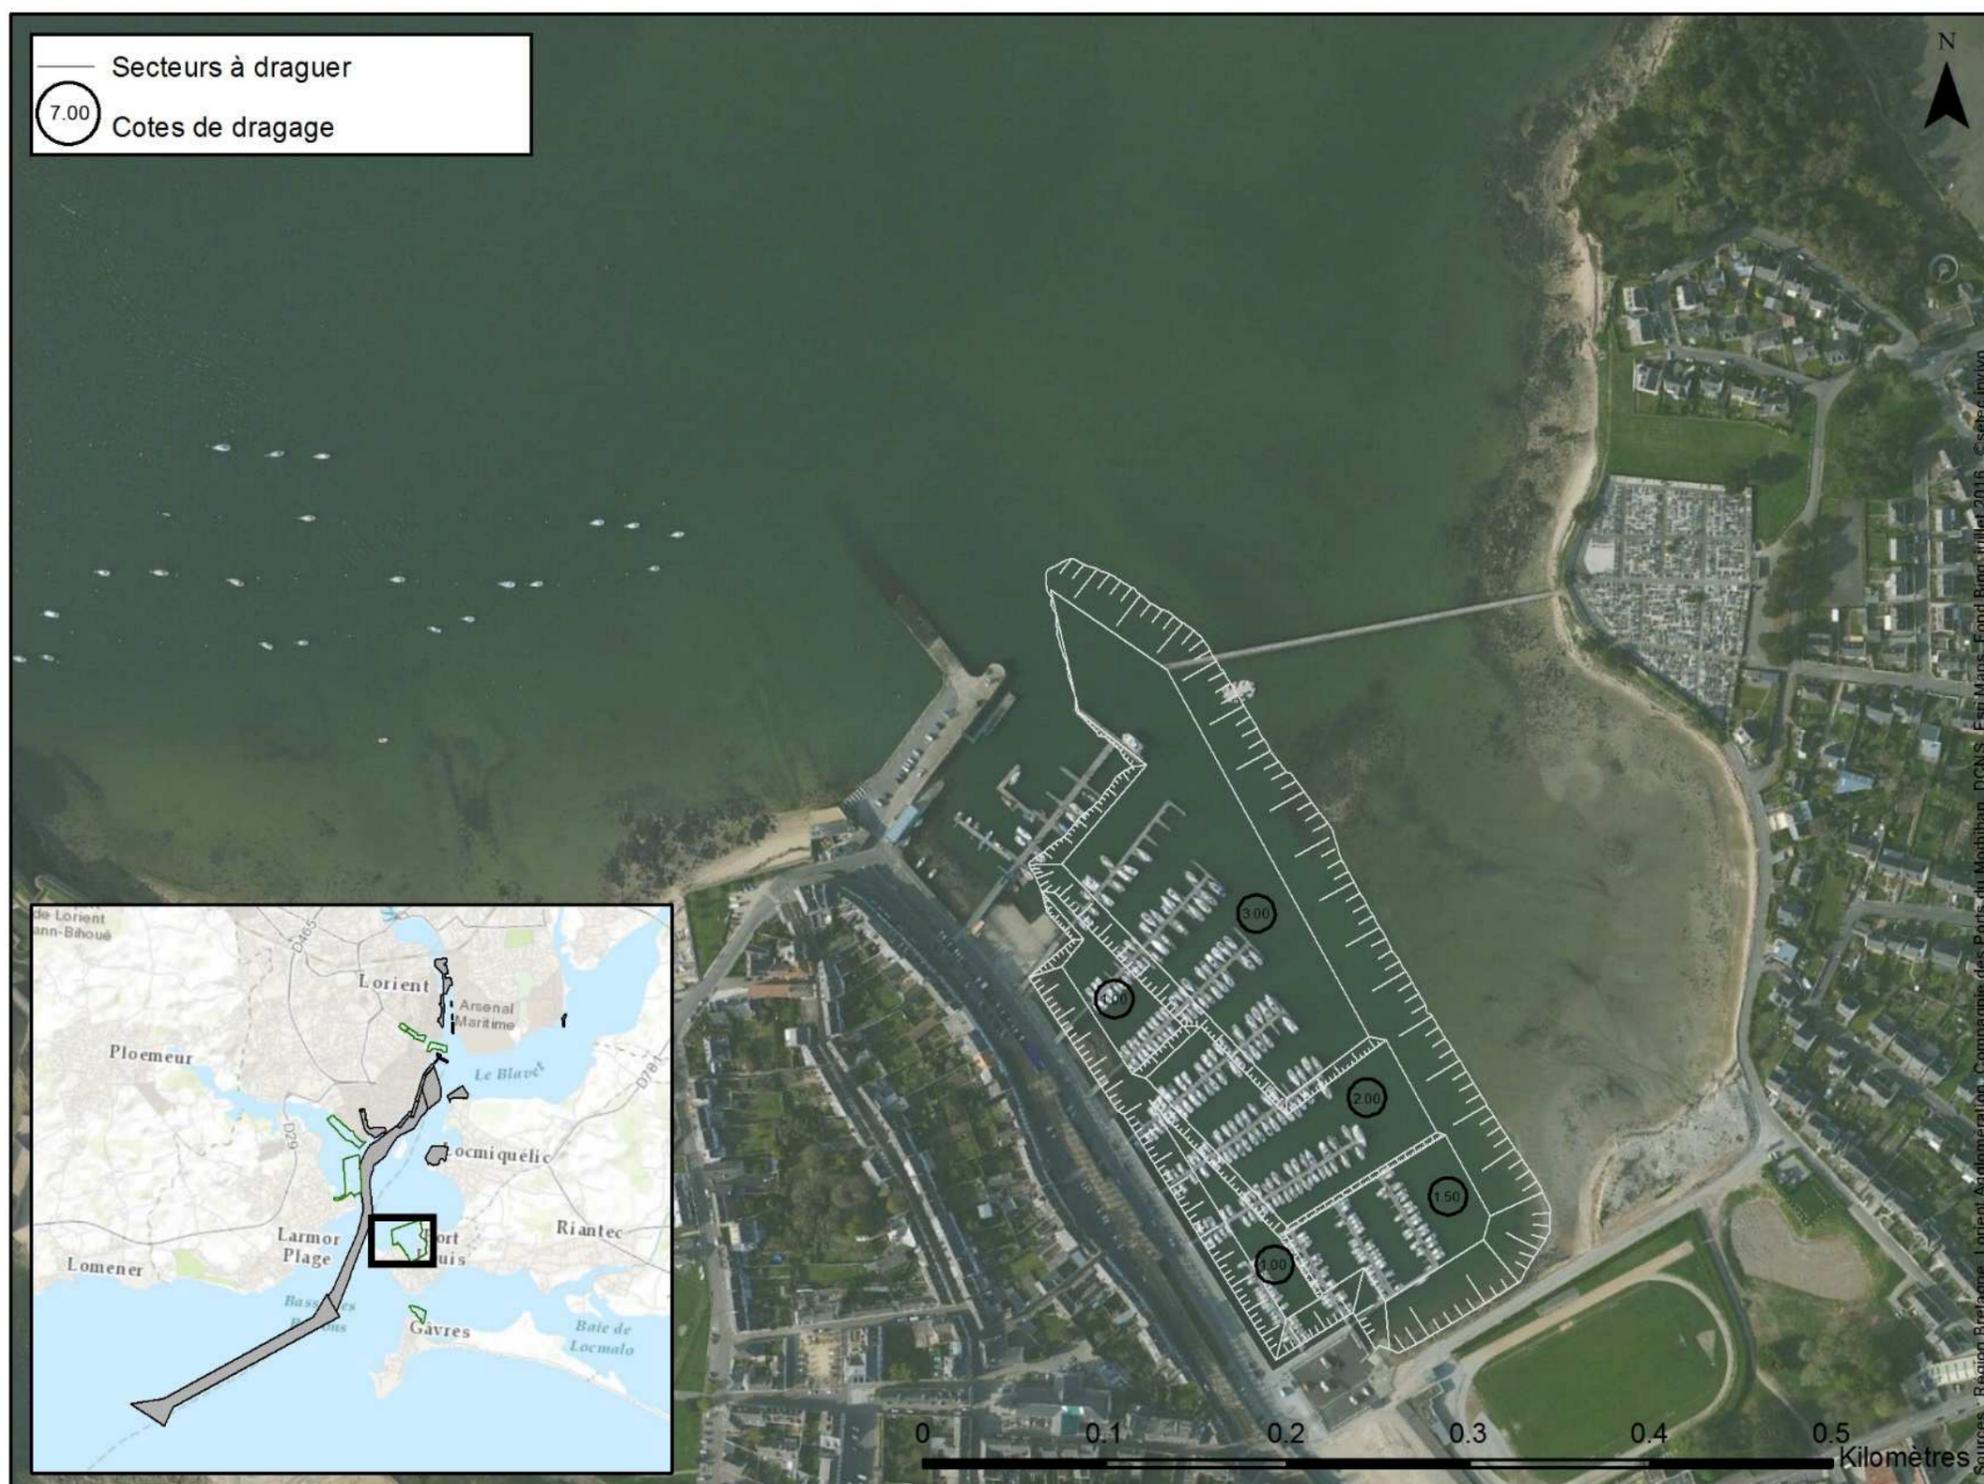

BAN-GÂVRES

La dernière opération de dragage sur le port de Ban-Gâvres date de 2001.

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
2001	Entretien	1 500	Site d'immersion de Groix	NR

Historique des opérations de dragage




Sources : Région Bretagne, Lorient Agglomération, Compagnie des Ports du Morbihan, DCNS, Esri Maps, Fond Bing, juillet 2016. ©setec in vivo

CHENAL INTERIEUR

La dernière opération de dragage dans cette zone date de 2011, dans le cadre des travaux d'approfondissement des accès au port de Lorient lié au projet d'amélioration de la capacité d'accueil du port de commerce (approfondissement à la cote 10 m CM).

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
2010	Travaux neufs	162 800	Site d'immersion de Groix	DAM
2011	Travaux neufs	60 400	Site d'immersion de Groix	DAM

Historique des opérations de dragage

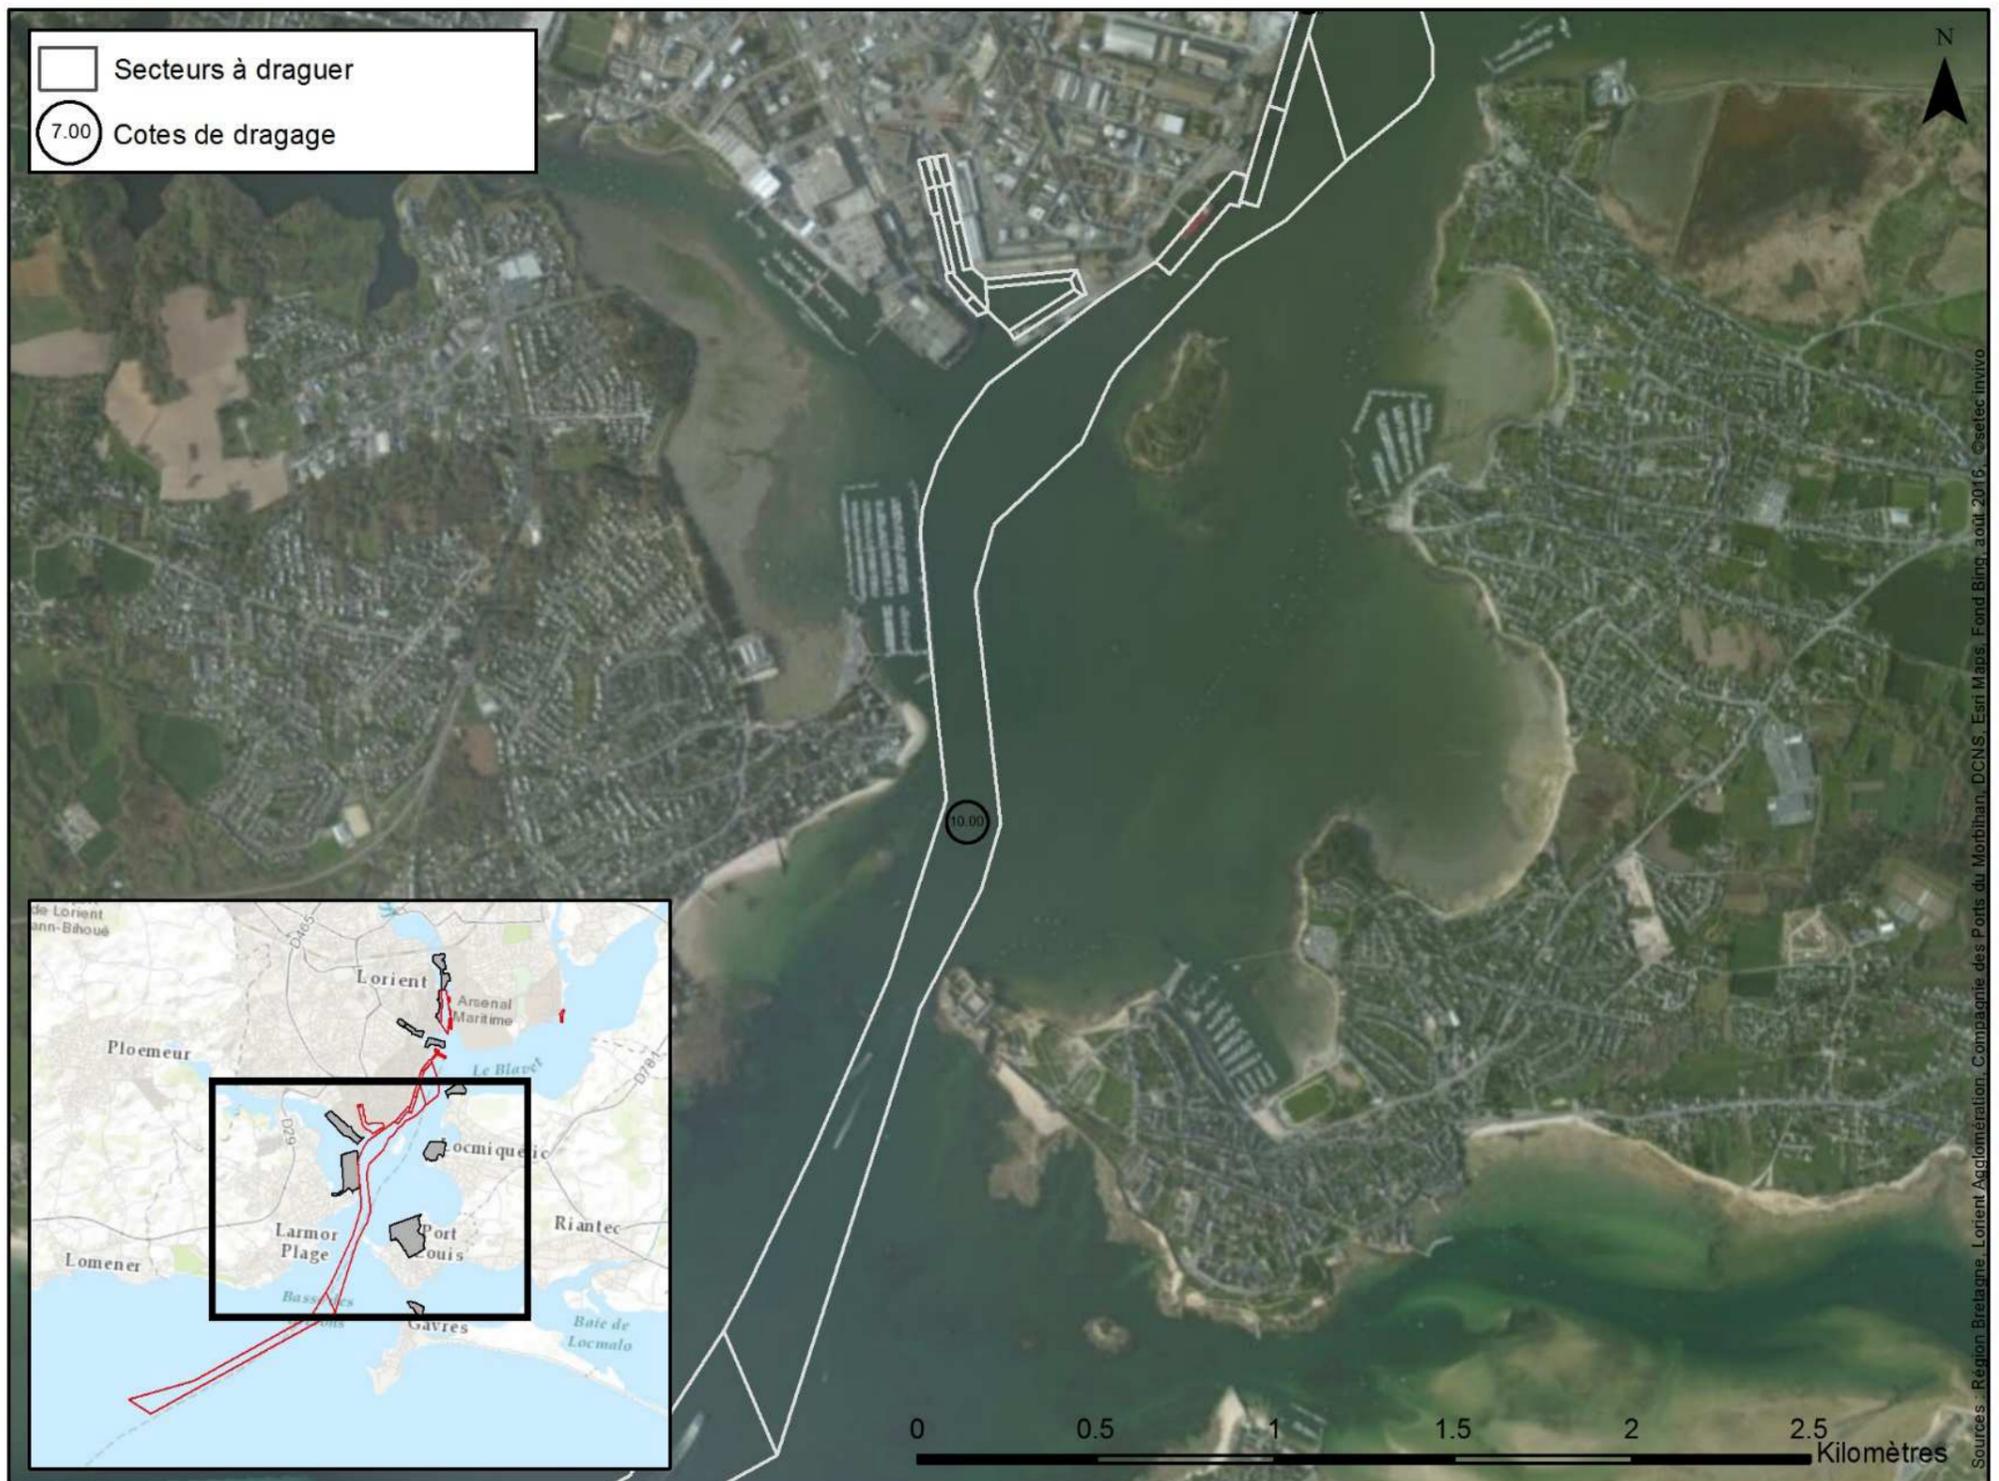

PASSE OUEST

La dernière opération de dragage dans cette zone date de 2012, dans le cadre des travaux d'approfondissement des accès au port de Lorient lié au projet d'amélioration de la capacité d'accueil du port de commerce (approfondissement à la cote 10 m CM).

Date	Type de travaux	Volume (m ³)	Destination des sédiments	Matériel
2001	NR	50 000	Site d'immersion de Groix	NR
2012	Travaux neufs (approfondissement à -10 m CM)	659 846	Site du Grasu	DAM
2012		355 462	Rechargement de plages	DAM
2012		4 385	Commercialisation	NR
2013		5 300	Site d'immersion de Groix	DAM

Historique des opérations de dragage

